

Nya tunnelbanan

Niklas Bergman

Trafiknämnd, förvaltningschefsinformation

2025-02-19


Barkarby
Anläggningsarbeten, Barkarbystadens stn- Akalla Rover
Bana El + Signal Strukton
Bygg, installation och tele, Skanska
Anläggningsarbeten Barkarbystaden till Barkarby Implenia
Rulltrappor Kone
Hägerstalund
Herresta
Robot-höjden
Barkarby handelsplats
Landningsbanan
Gamla flygfältet
E18
E4
Barkarbystaden
Akallalänken
Akalla Stadspark
Akalla
Akalla
Kyrkbyn
Norrviksvägen
Hästa
Husby
Husby
275
Igelbäcken
Veddesta
Barkarby
Granholmstoppen
Enköpingsvägen
Blå linje till
Barkarby
Trafikstart: 2027

Arenastaden





Nacka - Söderort



Hela Blå linje färdigsprängd


Precis klockan 19.30 i tisdags kväll sprängdes den allra sista tunnelsalvan för hela utbyggnaden av Blå linje. Nu är tunnlarna klara – från Barkarby till Nacka och till Söderort.

Nyhet Nacka, Nya tunnelbanan, Södermalm, Söderort 2025-01-29



Sista tunnelsalvan för hela Blå linje sprängdes under tisdagen den 28 januari. Foto: Region Stockholm.

Förhandling i mark och miljödomstolen 13 feb ang. nya inläckagevillkor Södermalm, dom väntas 1 april

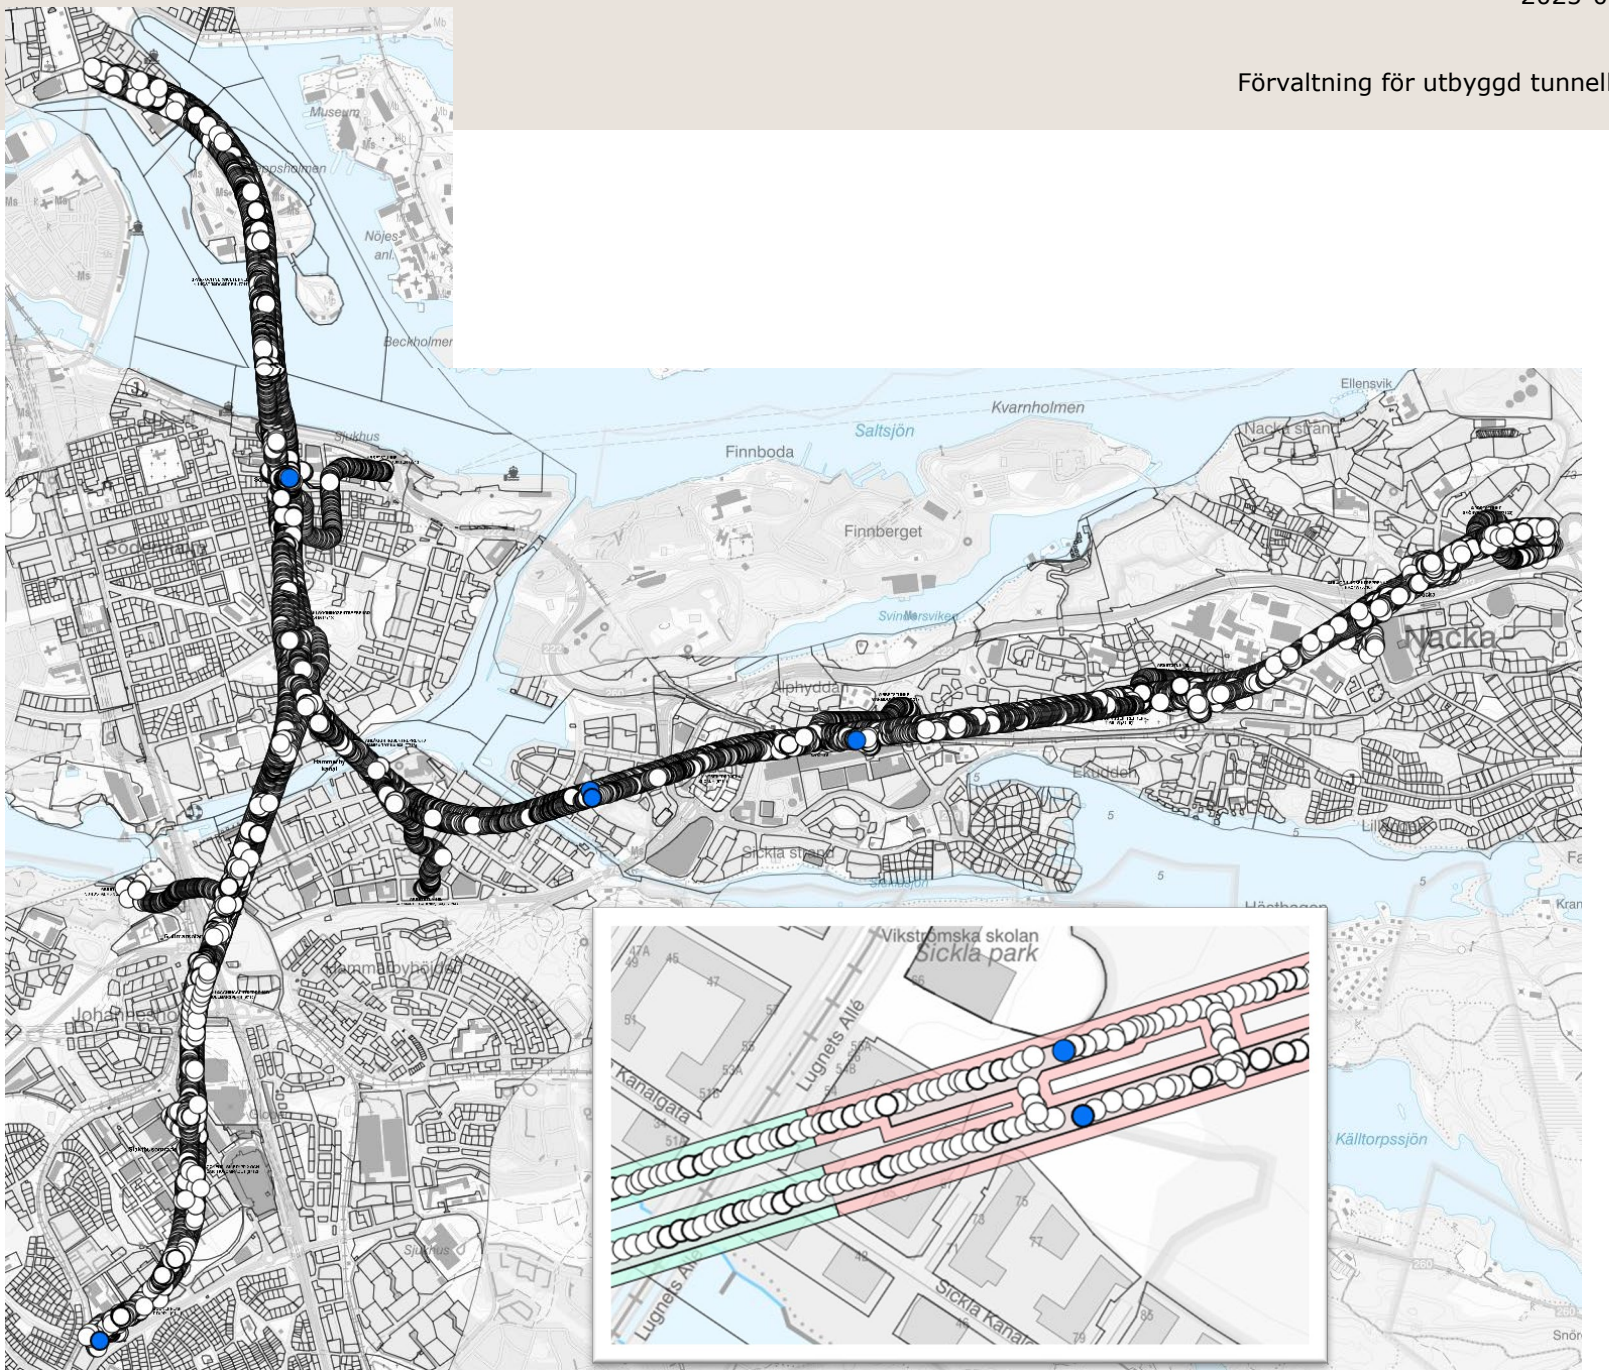


Region Stockholm

Depå i Högdalen

Städ och uppställningshall
överlämnad till TF under januari.



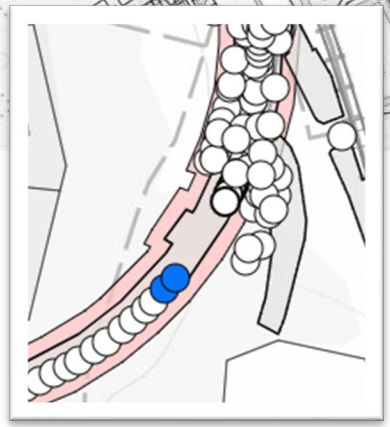



Genomslag Hökarängen
planeras till 20 feb

Depå i Högdalen


Färdigställd Depå 2026



Status Gul linje

- Miljödom, ansökan lämnades in 17 december 2024, för slutförhandling preliminärt under hösten 2025
- Järnvägsplan, MKB inlämnad till Lst i november 2024, granskning våren 2025, planerad inlämning till TrV planprövn hösten 2025
- Upphandling pågår av förberedande arbeten, första kontrakt tecknat PEAB
- Bygghandlingsprojektering igång
- Upphandling av arbetstunnlar, sponter och vertikalschakt kommer att ske under 2025 för byggstart i slutet av 2025
- Upphandling huvudentreprenader berg och anläggning under 2025-2026 med byggstart våren 2026
- Kontrollstation 3.1 Q2 2025
- Kontrollstation 3.2 prel. Q2 2026

Fortsatt arbete med behovsanalys och start lokaliseringsutredning

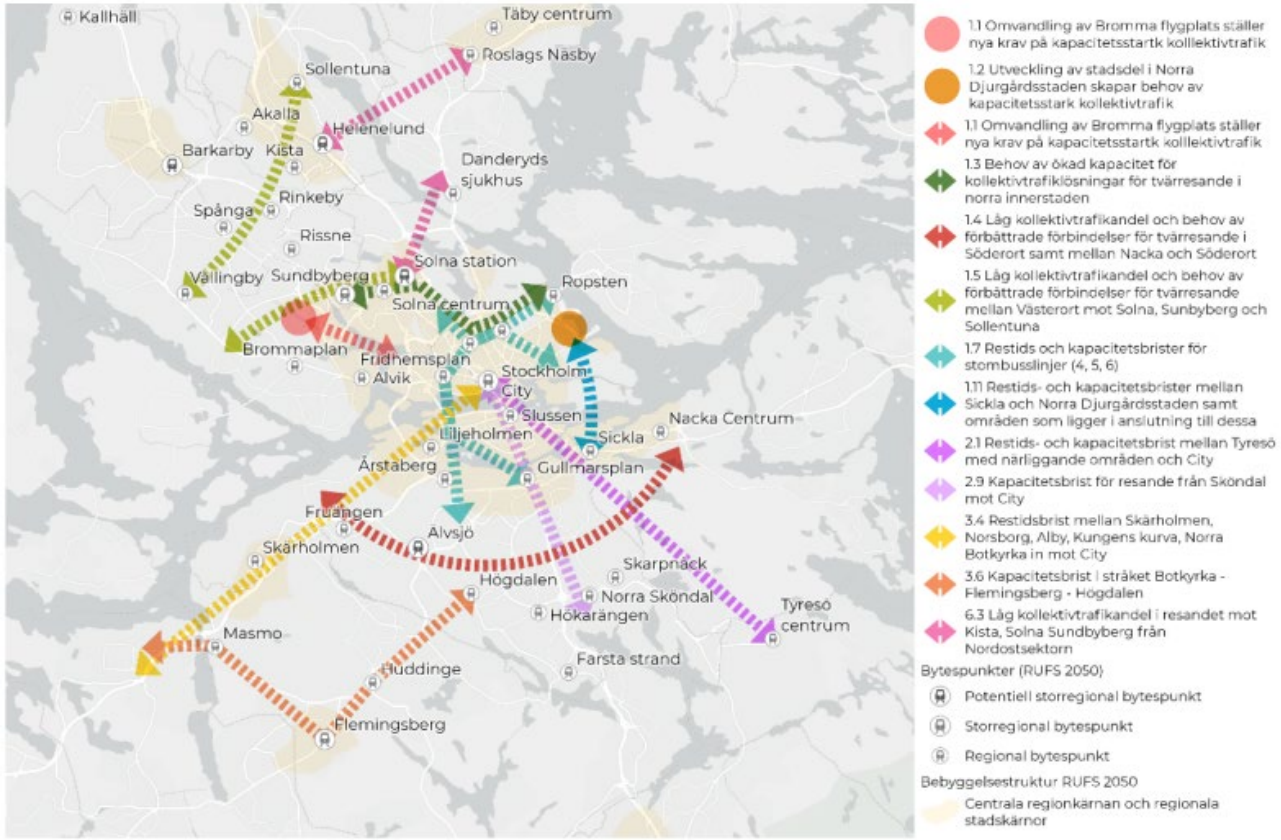

Figur 7, Behov för fortsatt fördjupning från januari 2024, TN 2023-0666 FUT 2023-0333

