
ID	Aktivitet	Varaktighet	Start	Slut
1				
2	Förstudie	171 dagar	fr 25-08-01	fr 26-03-27
3	Tid för planeringsbeslut	42 dagar	må 26-03-30	ti 26-05-26
4	Planeringsbeslut	0 dagar	ti 26-05-26	ti 26-05-26
5	Upphandling konsultgrupp	65 dagar	on 26-05-27	ti 26-08-25
6				
7	**Planeringsskede projektering**	**395 dagar**	**on 26-08-26**	**ti 28-02-29**
8	Programhandling	8 månader	on 26-08-26	ti 27-04-06
9	Systemhandling	8,25 månade	on 27-04-07	ti 27-11-23
10	FU Etapp 1	5 månader	on 27-10-13	ti 28-02-29
11	**Genomförandeskede**	**857 dagar**	**on 27-11-24**	**to 31-03-06**
12	Bygghandling	12 månader	fr 28-02-11	to 29-01-11
13	Tid för genomförandebeslut	57 dagar	on 27-11-24	to 28-02-10
14	Genomförandebeslut	0 dagar	to 28-02-10	to 28-02-10
15				
16	Upphandling Entreprenrör	70 dagar	fr 28-02-11	to 28-05-18
17	**Genomförande entreprenad**	**730 dagar**	**to 28-05-18**	**to 31-03-06**
18	Första spadtag	0 dagar	to 28-05-18	to 28-05-18
19	Etapp 1	24 månader	fr 28-05-19	to 30-03-21
20	Överlämning	45 dagar	fr 30-03-22	to 30-05-23
21	Etapp 2	14 månader	fr 28-09-08	to 29-10-04
22	Överlämning	45 dagar	fr 29-10-05	to 29-12-06
23	Etapp 3	14 månader	fr 29-12-07	to 31-01-02
24	Etapp 4	12 månader	fr 29-12-07	to 30-11-07
25	Överlämning	45 dagar	fr 31-01-03	to 31-03-06

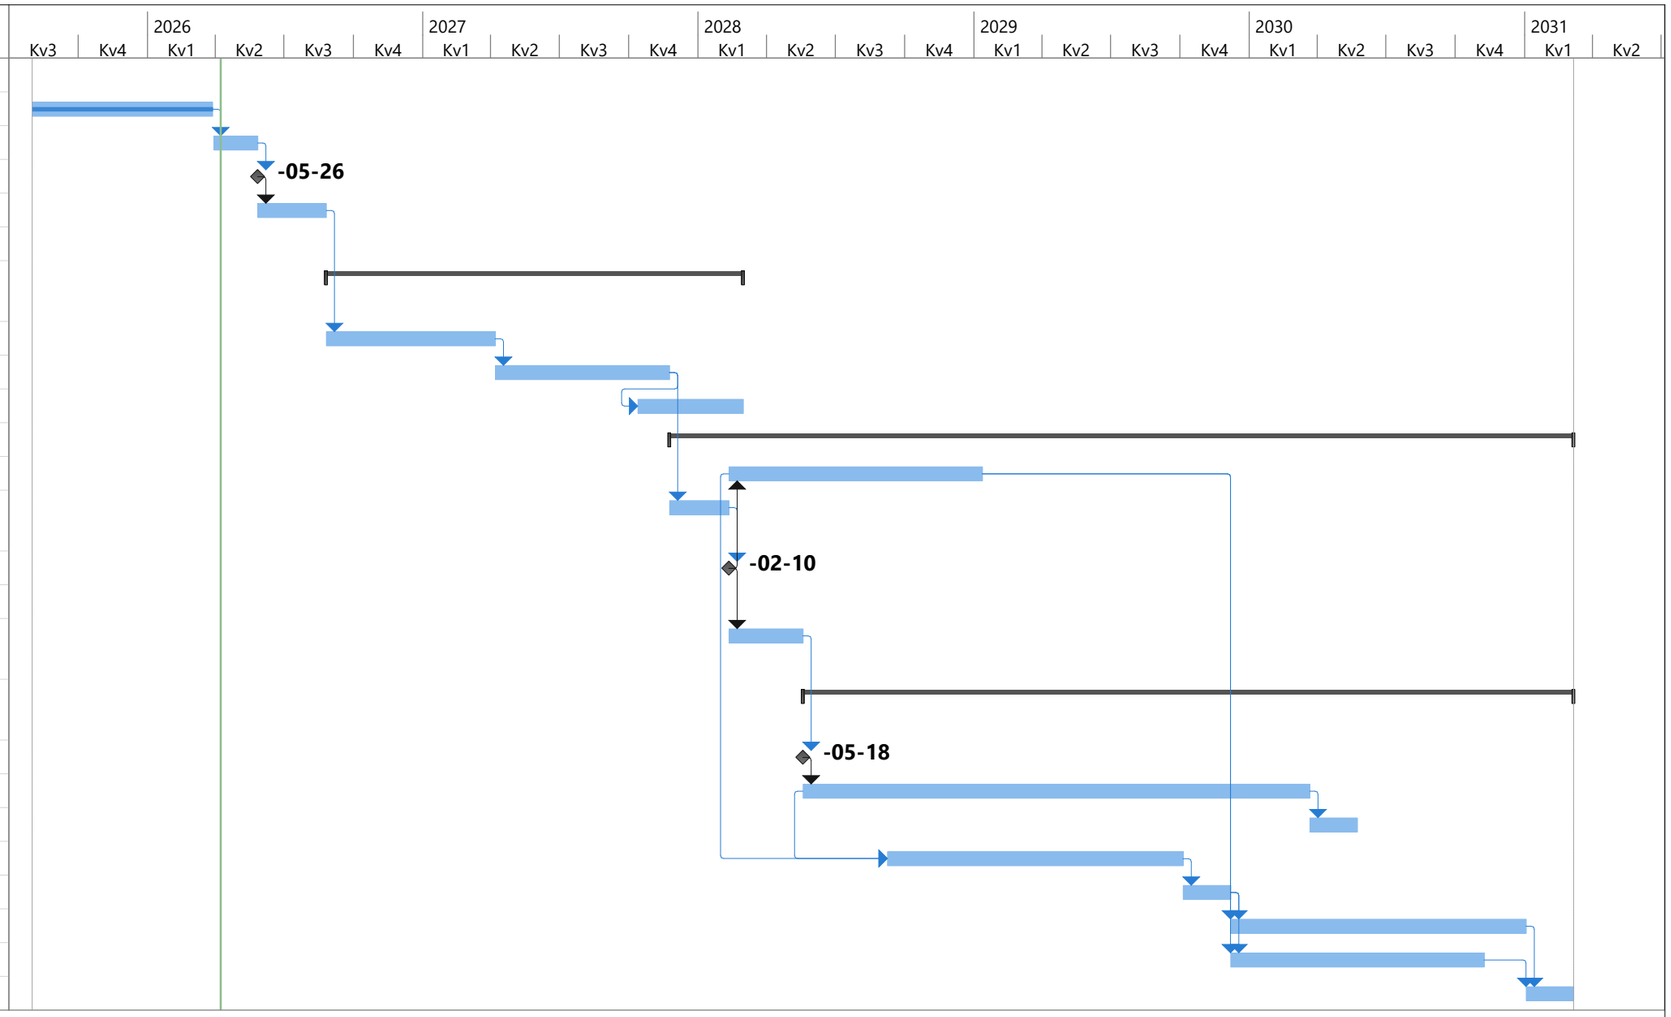

Projekt: Tidplan I huset
Datum: on 26-04-08

Aktivitet	Inaktiv aktivitet	Upplyft manuell sammanfattning	Extern milstolpe
Delad	Inaktiv milstolpe	Manuell sammanfattning	Måldatum
Milstolpe	Inaktiv sammanfattning	Endast start	Förlopp
Sammanfattning	Manuell aktivitet	Endast slutdatum	Manuellt förlopp
Projektsammanfattning	Endast varaktighet	Externa aktiviteter	
