
Generationsskifte Vårdens IT
Statusrapportering

2022-12-02


Tentativ tidslinje för generationsskifte vårdens IT

(RS 2019-1041 bilaga 6, RS 2020-0711)

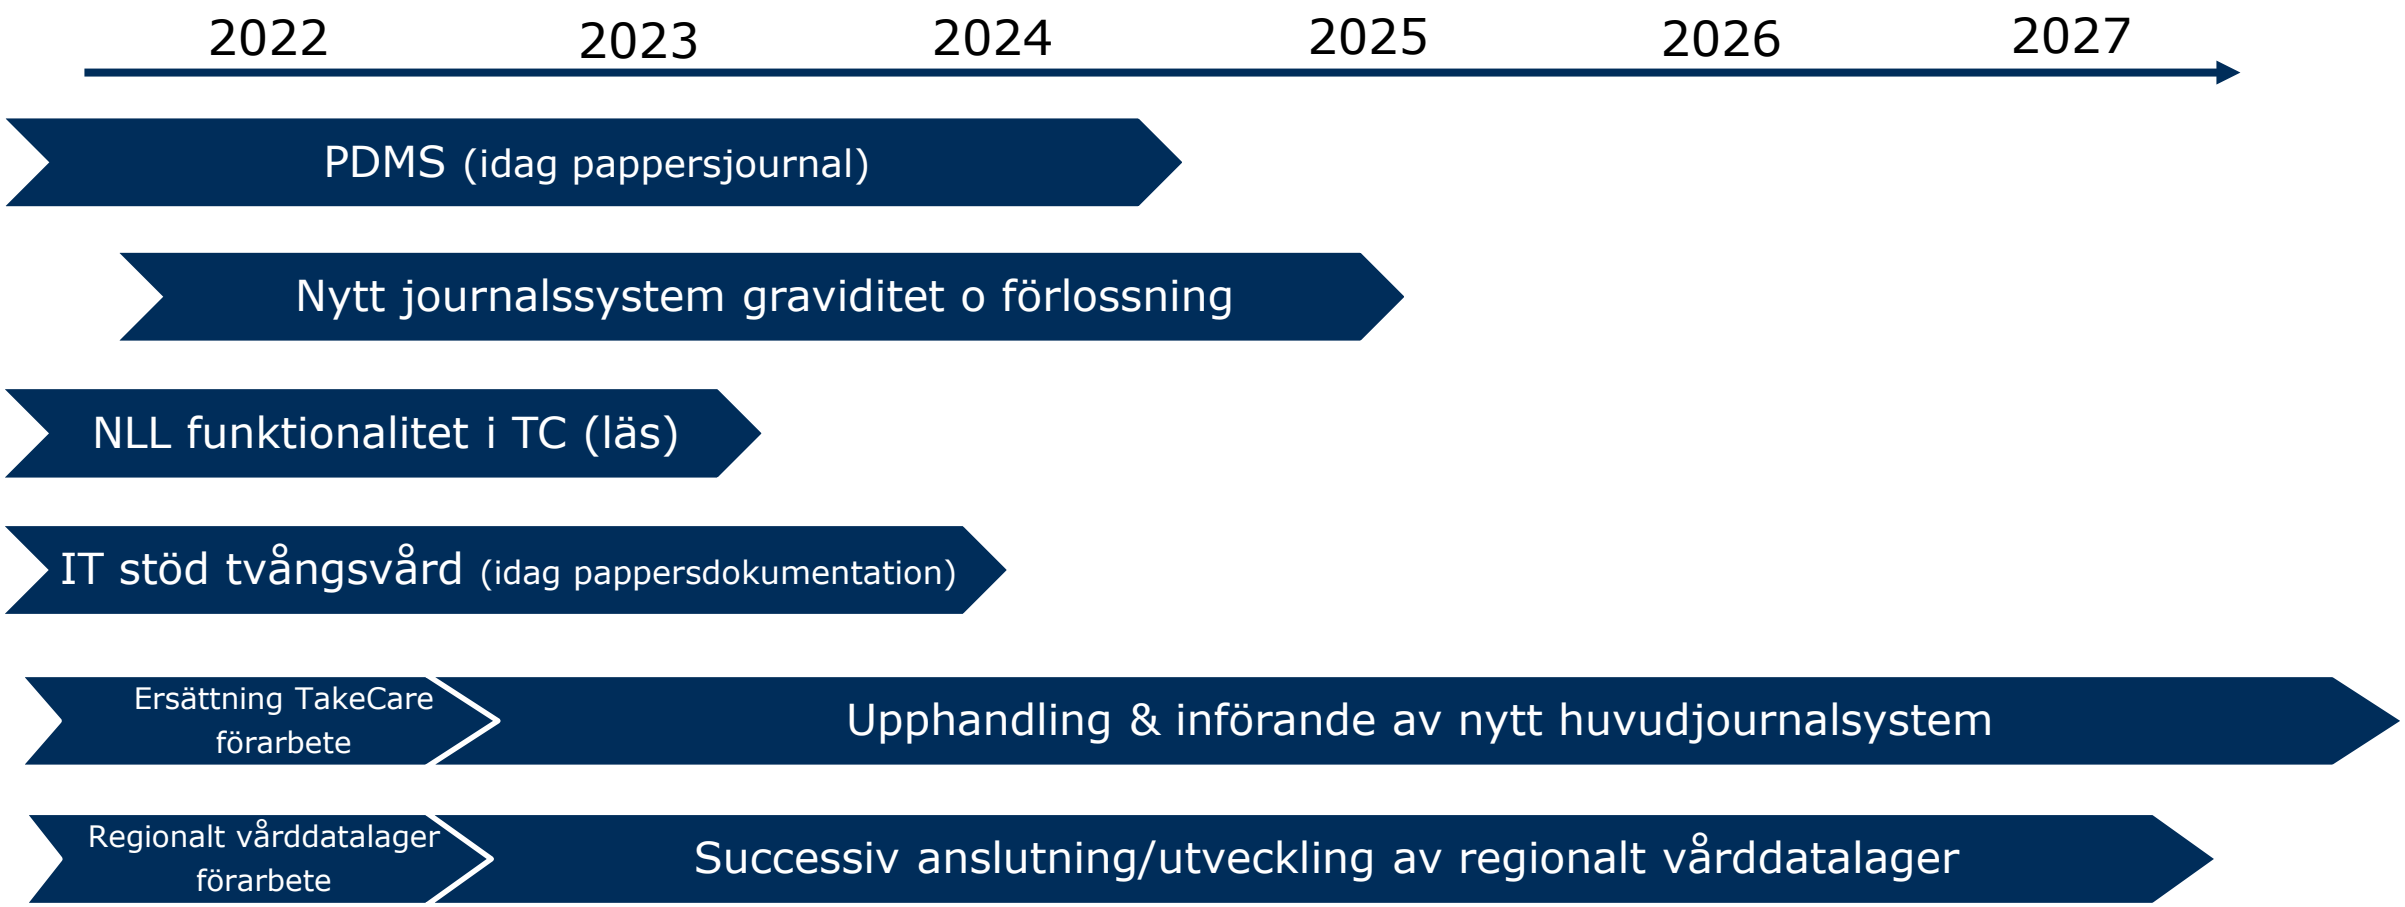

Nuläge Anestesi och IVA

- Pappersjournal
- Scanning
- Svårtolkat
- Låg datakvalitet
- Forskning?
- Kvalitetsarbete & uppföljning?
- Beslutsstöd saknas

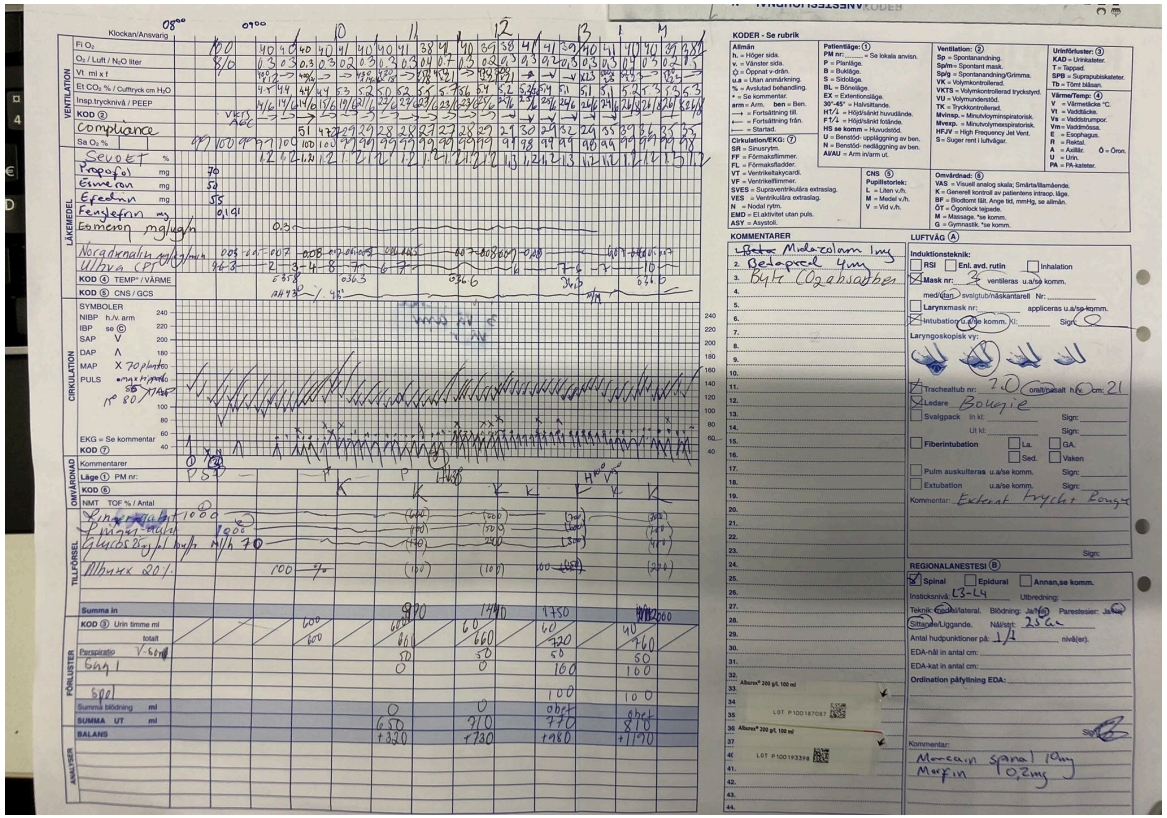


PDMS (idag pappersjournal)

Målbild

- Digital ”anestesikurva”, ”IVA-lakan”, etc.
- Samma system på operation post.op och IVA(vuxen, barn, neo)
- Automatisk dokumentation av data
  - Monitorer, läkemedelspumpar, övrig MT-utrustning
- Förenklad manuell dokumentation
  - Förprogrammerade mallar
  - Lokala anpassningar
- Uttag av data
  - Forskning, uppföljning, kvalitetsarbete
  - Export till kvalitetsregister
- **Frigör tid till patienten**





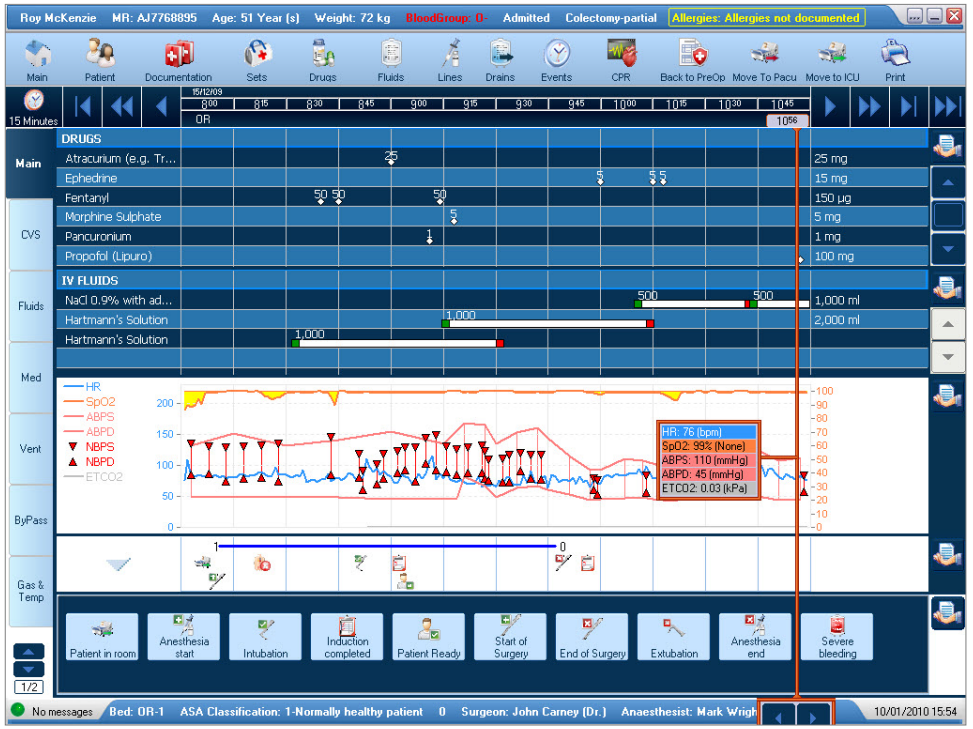







PDMS (idag pappersjournal)

Status PDMS (journalsystem för Ane/IVA/Neo/ECMO)

- Upphandling avslutad (lokalt samordnad upphandling, avtal tecknat med Karolinska), konfiguration pågår, planering införande pågår med lokala teams på sjukhusen
- Pilot på DSAB i Q2/2023
- Utbildning och införande på DSAB och SÖS hösten 2023
- Utbildning och införande övriga sjukhus 2024-2025 (inkl Region Gotland)
- Projektavslut Q2/2025

PDMS (idag pappersjournal)

Status Journalsystem för Graviditet och förlossning

- Upphandling pågår och bör vara klar i Q1/2023
- Planering och implementering under 2023
- Utbildning och införande påbörjas 2024 och pågår under 2025
- Projektavslut slutet 2025 eller början 2026

Projektets omfattning

- Modernt journalsystem med utvecklingsförmåga, öppna standardiserade gränssnitt, hög andel strukturerad data, integrationer, ultraljud, konformitet till lagar och regler
- Lokalt samordnad upphandling och SLSO har ansvar för upphandling

Status Nationell Läkemedelslista och IT-stöd Tvångsvård

Lagen om nationell läkemedelslista

- 2023 kommer läsförmåga att införas i Region Stockholm och Region Gotland (framflyttad tidplan av EHM)

IT-stöd Tvångsvård

- Första upphandling avbruten under hösten 2022 pga bristande konkurrens
- Styrgrupp tagit beslut om gå ut med ny upphandling under våren 2023 (tar för lång tid att vänta in huvudjournalsystem)

NLL funktionalitet i TC (läs)

IT stöd tvångsvård (idag pappersdokumentation)

Nytt huvudjournalsystem - Vad vill vi åstadkomma och vägen fram

- Ett välfungerande journalsystem som täcker dagens behov av journaldokumentation, patientadministration, remisser och svar samt beställningar och svar
  - Tänkbara framtida behov ingår inte in upphandling, alla krav och initiativ kommer att prövas mot nyttan för verksamheten
- Ett journalsystem som kan vidareutvecklas och har öppna standardiserade gränssnitt för att dela data

Tillvägagångssätt

- Litet upphandlingsprojekt med ca 15-20 personer, arbetsgrupper med verksamheten kring krav och funktionalitet.
- Arbetet startar efter beslut har tagits i fullmäktige (dec 2022)
- Projektstyrgrupp med representanter från regionägda vårdgivare med möten månadsvis

Regionalt vårddatalager - Vad vill vi åstadkomma och vägen fram

- Ett regionalt vårddatalager som lagrar och tillgängliggör information, helst i neutralt format och på neutral plats (ej inlåst i system såsom i TakeCare)
- Automatisera informationsflöde till nationella kvalitetsregister med fördelen att data även finns tillgänglig i regionens datalager för analys och uppföljning
- Förmåga att utveckla stöd till verksamheten, såsom it-stöd till vårdförlopp och patientöversikter med information från olika journalsystem

Tillvägagångssätt

- Regional styrgrupp tar beslut om initiativ eller funktionalitet, t ex anslutning till kvalitetsregister XYZ. Avgörande är nyttan för verksamheten.
- Styrgruppen bemannas med representanter från vårdgivare
- Det regionala vårddatalagret byggs successivt utifrån beslut i regional styrgrupp och specifika behov
